

第14回

加賀温泉駅施設整備検討委員会

令和6年8月22日（水）

【報告事項1】

駅周辺施設整備のスケジュールと現状

加賀温泉駅周辺施設整備スケジュール

		2024年度 (令和6年度)	2025年度 (令和7年度)	
駅南側広場 (温泉中央口)	3月16日	駅南側広場工事 仮駅舎撤去	12月1日	全天候型広場施設 (ガレリア)工事
にぎわい 交流施設等	北陸新幹線金沢・敦賀間開業	にぎわい施設工事	にぎわい交流施設オープン	R8年3月
地下自由通路		地下通路工事		駅前広場グランドオープン
駅北側広場 (日本海口)		駐輪場工事		

加賀温泉駅 温泉中央口(駅南側)の整備状況

にぎわい交流施設

令和6年12月1日オープン

JR加賀温泉駅

一般車
エリア

タクシー
エリア

全天候型
広場施設
(ガレリア)

バス
エリア

令和8年3月完成

長時間
駐車場

美術館

温泉中央口(駅南側) 正面の整備状況



温泉中央口 バスエリアの整備状況



温泉中央口 コロネードの整備状況




温泉中央口 一般車エリアの整備状況



【報告事項2】

加賀温泉駅にぎわい交流施設について

加賀温泉駅にぎわい交流施設（高架下都市施設）

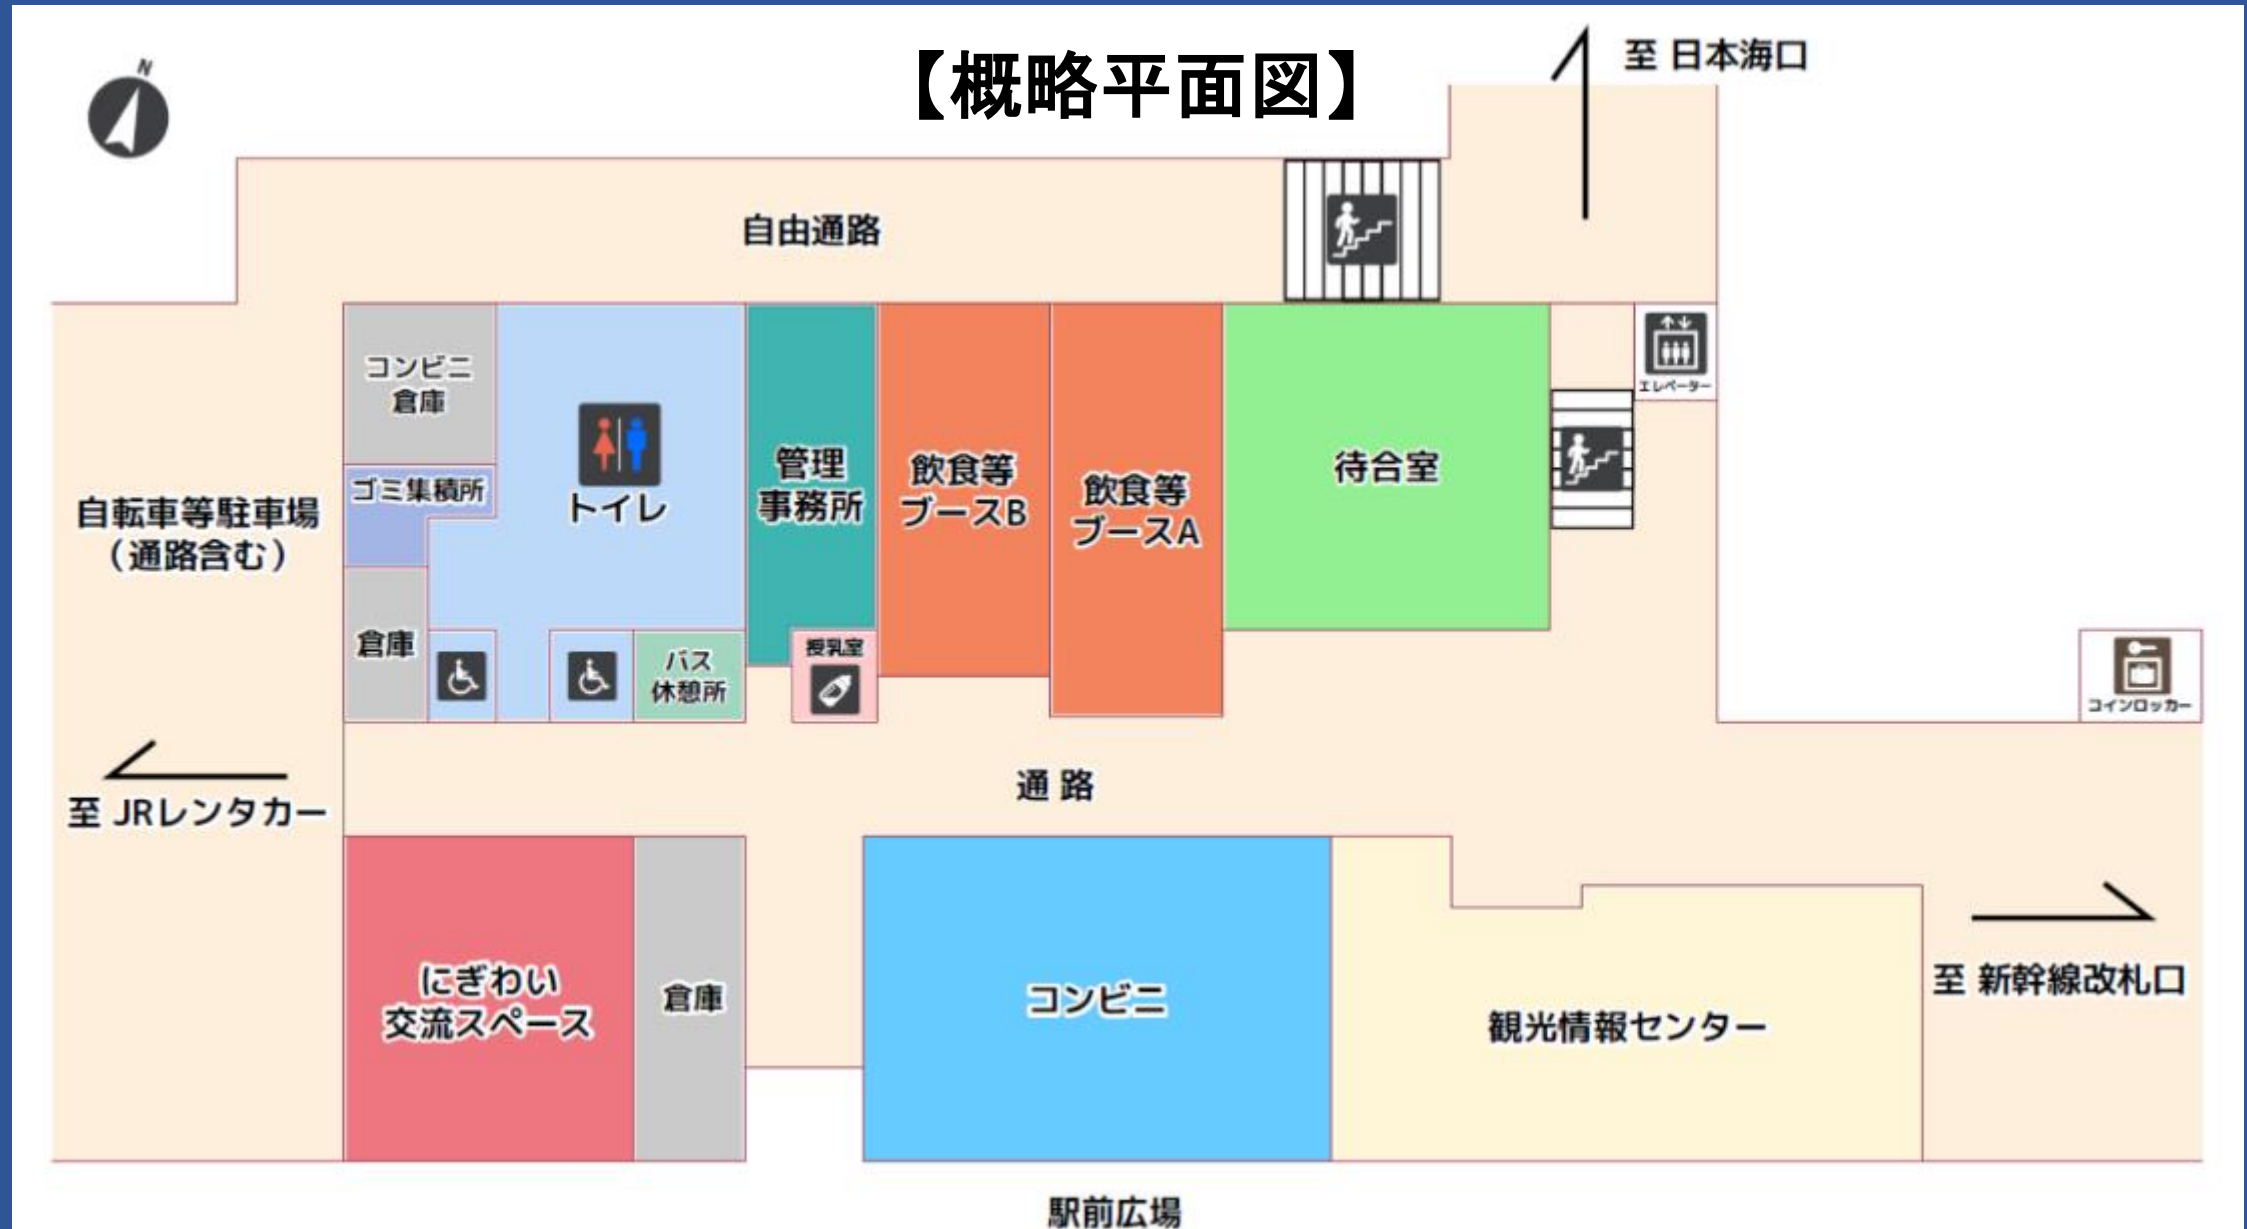

加賀温泉駅にぎわい交流施設の整備状況



にぎわい交流施設イメージ（観光情報センター）



にぎわい交流施設イメージ（待合室）



加賀温泉駅にぎわい交流施設の指定管理者

R 6 年 6 月 2 4 日～7 月 1 9 日 公募

7 月 2 9 日 選定会の開催
※応募団体数：2 団体

8 月上旬 指定管理者候補者選定

9 月議会 指定の議決

1 0 月～1 1 月 業務開始に向けた準備

1 2 月 1 日 オープン
※約 5 年間の指定管理

【報告事項3】

全天候型広場施設「ギャラリー」について

ガレリアと広場イメージ（鳥観図）



ガレリアイメージ（正面から望む）

